



FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES



RELATÓRIO PARCIAL (SITUAÇÃO: APROVADA PELO CONSÓRCIO)
Enviado por PEDRO HENRIQUE TETTE HOSKEN em 20/06/2024 - 14:13


15ª MEDIÇÃO															
Período de 21/05/2024 a 20/06/2024															
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE MEDIDA		VALOR MEDIDO				SALDO		
							NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADA	VALOR PREVISTO (BDI)	VALOR PREVISTO (ADIMC)	NESTA MEDIÇÃO (BDI)	NESTA MEDIÇÃO (ADIMC)		ACUMULADA (BDI)	ACUMULADA (ADIMC)
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO														
01.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras que exigem a utilização de grande quantidade de equipamentos e são executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos, Obs.: Não se aplica aos serviços de Tapa Buracos.														
01.01.03	OBRAS DE VALOR ACIMA DE R\$ 3000.001,00 - MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO, EXCLUSIVE PARA TAPA-BURACOS	%	0,2	R\$ 81.450,179,25	R\$ 166.536,094,60	R\$ 33.307,218,92	0,2	1.60003931964	R\$ 33.307,218,92	R\$ 43.749,032,06	R\$ 323,88	R\$ 335,18	R\$ 21.545,06	R\$ 24.353,68	R\$ 33.285,67
13	SINALIZAÇÃO VERTICAL / HORIZONTAL														
13.01	SINALIZAÇÃO VERTICAL														
13.01.01	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	m²	60,35	R\$ 385,30	R\$ 489,14	R\$ 29.519,60	60,35	60,35	R\$ 29.519,60	R\$ 30.542,53	R\$ 31.709,10	R\$ 30.647,54	R\$ 31.709,10	R\$ -1.127,00	
13.01.02	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	m²	27,52	R\$ 376,88	R\$ 478,45	R\$ 13.166,94	23,29	27,52	R\$ 13.166,94	R\$ 13.623,23	R\$ 11.568,84	R\$ 13.670,01	R\$ 14.143,63	R\$ -503,00	
13.01.03	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	M²	24,96	R\$ 388,73	R\$ 493,50	R\$ 12.317,76	24,96	24,96	R\$ 12.317,76	R\$ 12.744,58	R\$ 13.231,30	R\$ 12.788,26	R\$ 13.231,30	R\$ -470,50	
13.01.04	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA TRIANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	M²	1,6	R\$ 352,69	R\$ 447,74	R\$ 716,38	1,6	1,6	R\$ 716,38	R\$ 741,20	R\$ 743,74	R\$ 743,74	R\$ 769,52	R\$ -27,36	
13.01.05	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	M²	2,01	R\$ 377,66	R\$ 479,45	R\$ 963,69	2,01	2,01	R\$ 963,69	R\$ 997,08	R\$ 1.035,17	R\$ 1.000,50	R\$ 1.035,17	R\$ -36,80	
13.02	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL														
13.02.02	LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESURA E LARGURA = 0,10M	m	29693	R\$ 2,15	R\$ 2,73	R\$ 81.061,89	14463,23	29309,73	R\$ 81.061,89	R\$ 83.734,26	R\$ 40.930,94	R\$ 42.377,26	R\$ 84.031,19	R\$ 87.070,63	R\$ -2.969,00



Nº 0235	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 27/05/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☁
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MOTORISTA
1	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	AIRLESS (PINTURA DE VIA)		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	SOPRADOR		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE FUROS P/ TACHÃO		
2	INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)

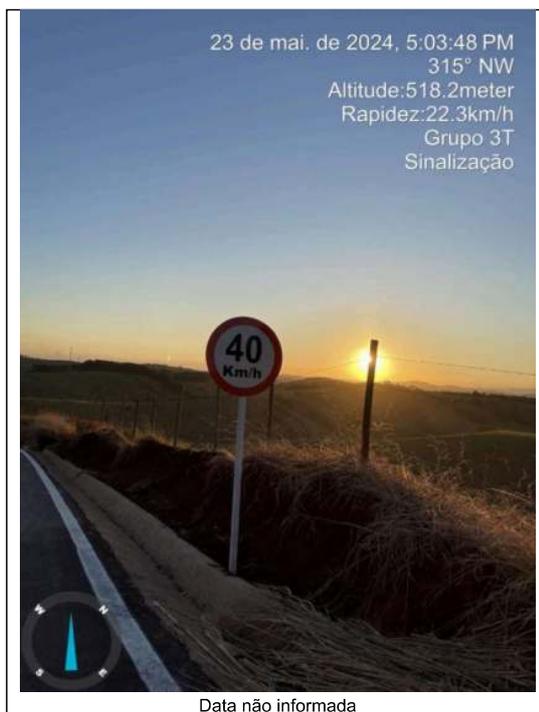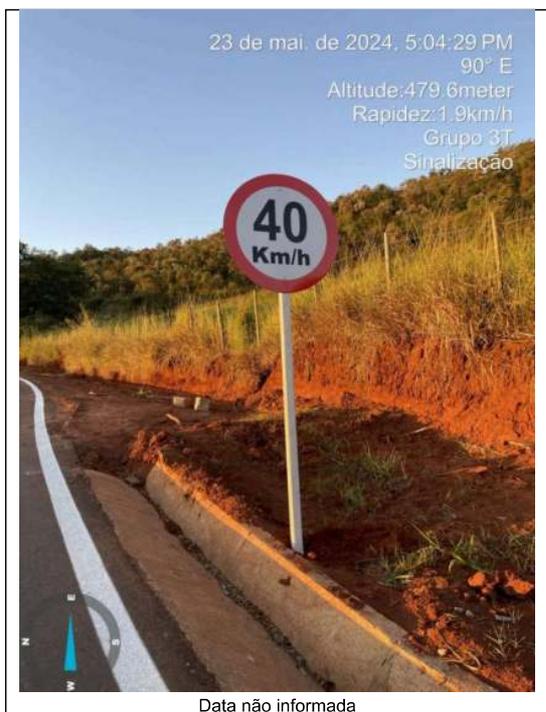


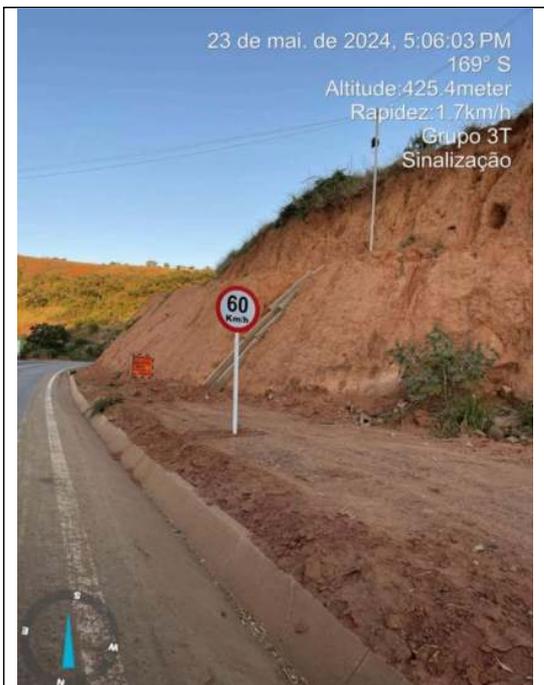


Data não informada



Data não informada



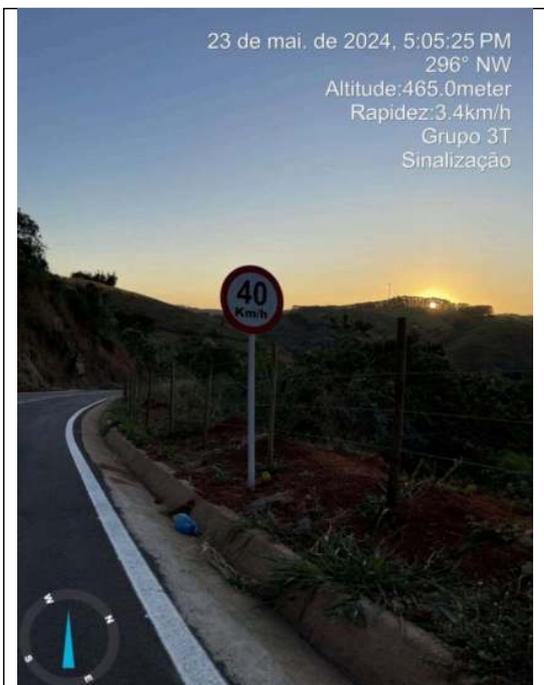



Data não informada

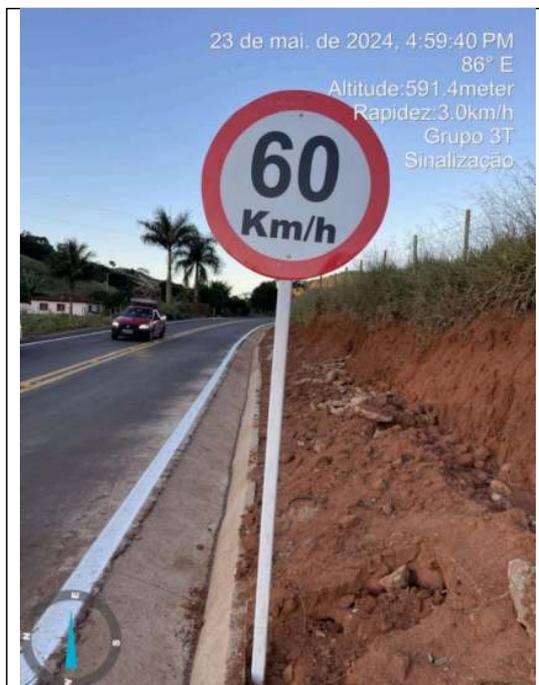


Data não informada



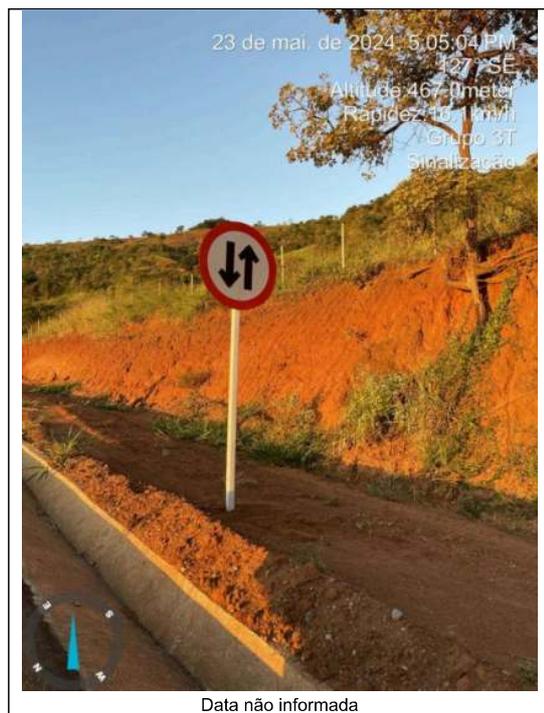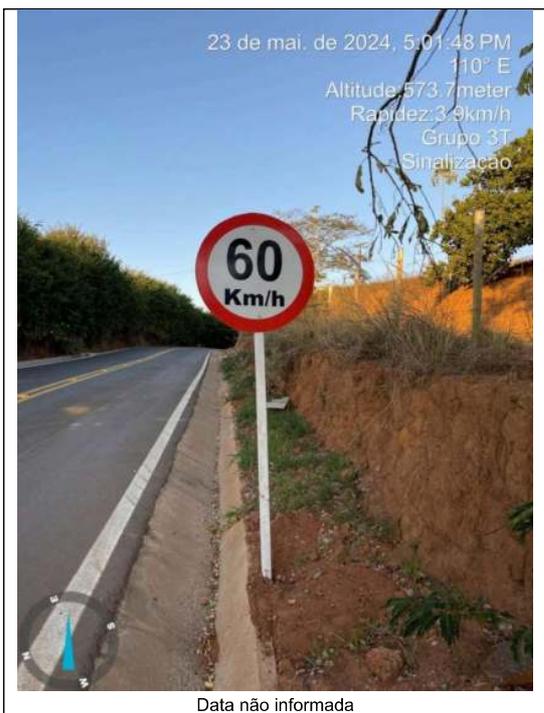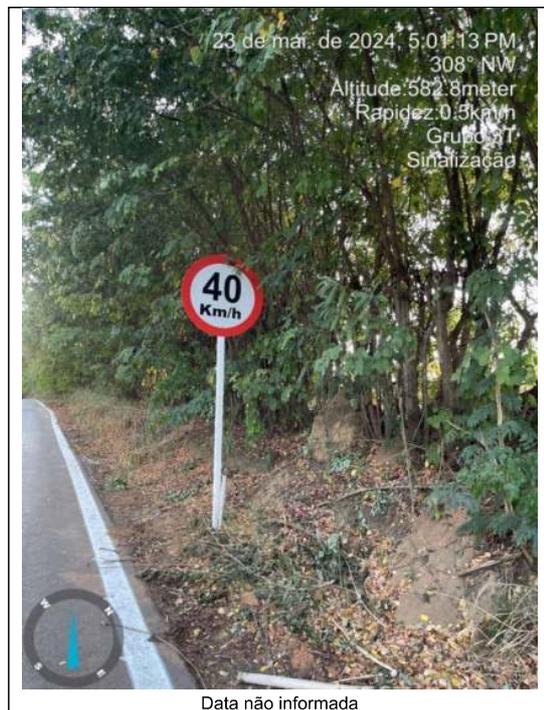

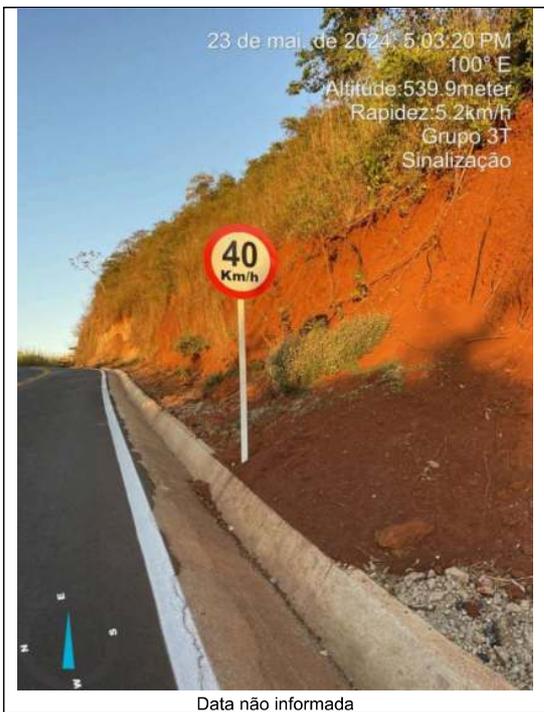

Data não informada

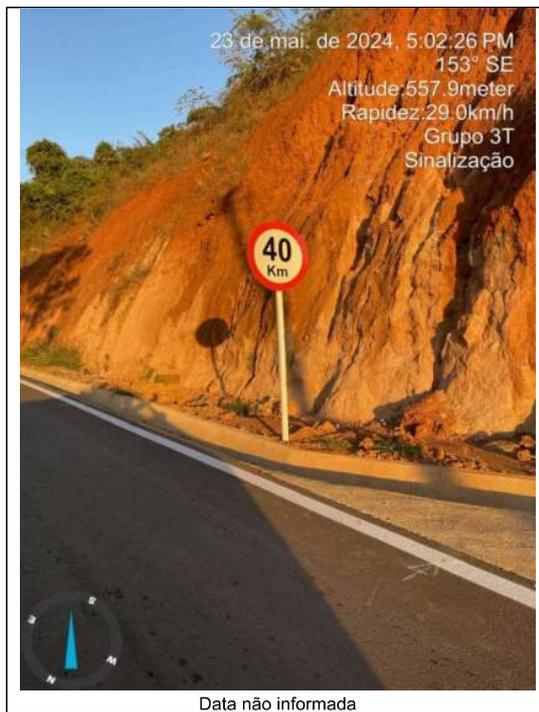

Data não informada

OCORRÊNCIAS	
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA
DESCRÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES	
EQUIPE E20 23/05/2024	
CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 28/05/2024 - 15:11)
Obs.:	Obs.:
ASSINATURAS	
<p>_____ JOSE MAURICIO PEREIRA DA SILVA Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 16403/D</p>	<p>_____ PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D</p>
<p>_____ Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T – SOLOCAP - CONEPP - PAVOTEC CREA 59784/D</p>	





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0234	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D		
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:		
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:		
DATA: 27/05/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☁
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
1	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MOTORISTA	
1	AJUDANTE			
QTDE	EQUIPAMENTO			
1	AIRLESS (PINTURA DE VIA)			
2	VEÍCULO DE APOIO			
1	SOPRADOR			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)				
OCORRÊNCIAS				
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA		
1	COLA	AGUARDANDO INSUMOS		
OBSERVAÇÕES				
EQUIPE E20 22/05/2024 NÃO HOUE ATIVIDADES				
CONFERÊNCIA				
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 28/05/2024 - 15:11)			
Obs.:	Obs.:			
ASSINATURAS				
_____ JOSE MAURICIO PEREIRA DA SILVA Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 16403/D	_____ PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	_____ Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T - SOLOCAP - CONEPP - PAVOTEC CREA 59784/D		






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0233	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D		
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:		
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:		
DATA: 27/05/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☁
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
1	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MOTORISTA	
1	AJUDANTE			
QTDE	EQUIPAMENTO			
1	AIRLESS (PINTURA DE VIA)			
2	VEÍCULO DE APOIO			
1	SOPRADOR			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES		
1	INSTALAÇÃO DE TACHÃO	550 UNIDADES		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)				
OCORRÊNCIAS				
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA		
OBSERVAÇÕES				
EQUIPE E20 21/05/2024				
CONFERÊNCIA				
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 28/05/2024 - 15:11)			
Obs.:	Obs.:			
ASSINATURAS				
JOSE MAURICIO PEREIRA DA SILVA Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 16403/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T - SOLOCAP - CONEPP - PAVOTEC CREA 59784/D


Nº 0232	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 21/05/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MOTORISTA
1	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	AIRLESS (PINTURA DE VIA)		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	SOPRADOR		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	INSTALAÇÃO DE TACHÃO	210 UNIDADES	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)

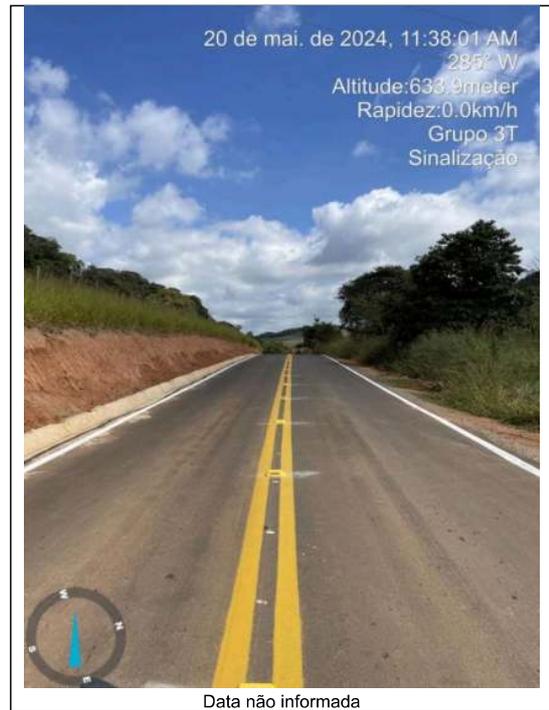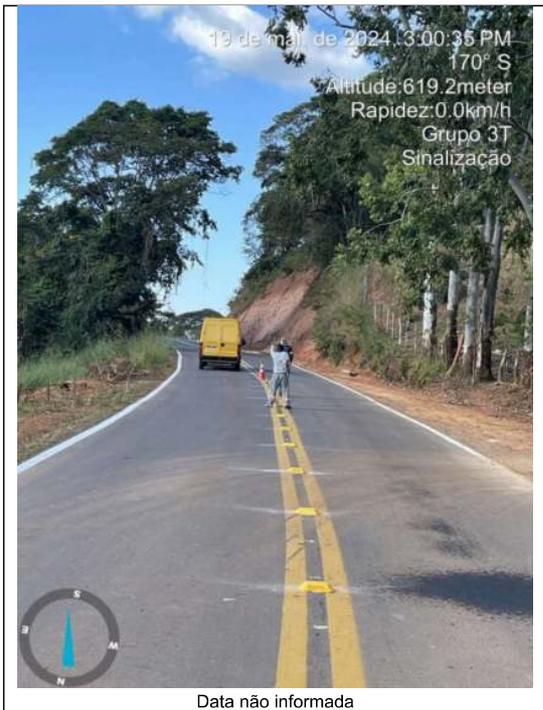

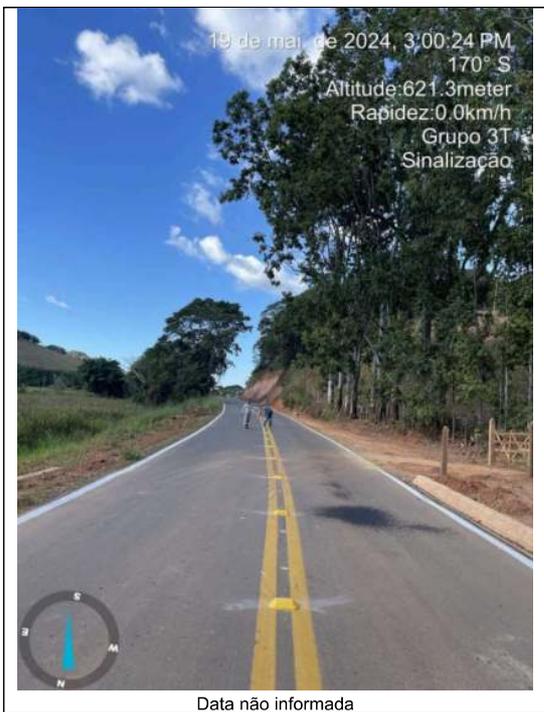

Data não informada

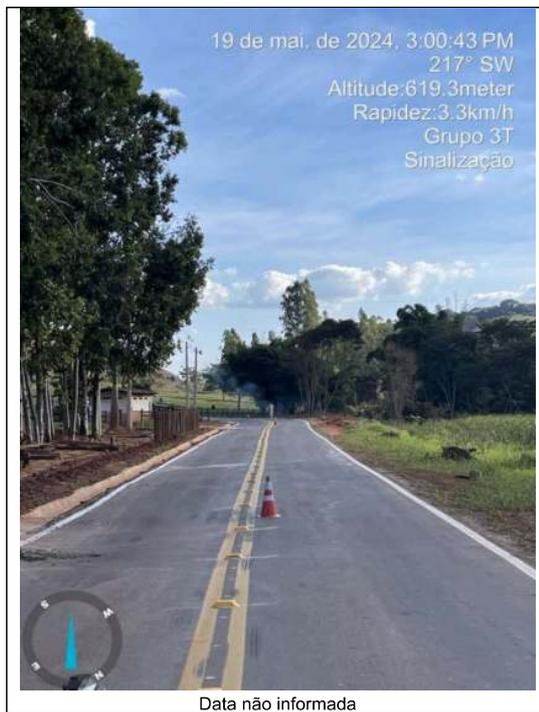



Data não informada


OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES		
EQUIPE E20 20/05/2024		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 22/05/2024 - 08:11)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
<p>_____ JOSE MAURICIO PEREIRA DA SILVA Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 16403/D</p>	<p>_____ PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D</p>	<p>_____ Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T – SOLOCAP - CONEPP - PAVOTEC CREA 59784/D</p>



Nº 0231	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 21/05/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MOTORISTA
1	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	AIRLESS (PINTURA DE VIA)		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	SOPRADOR		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	INSTALAÇÃO DE TACHÃO	210 UNIDADES	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)

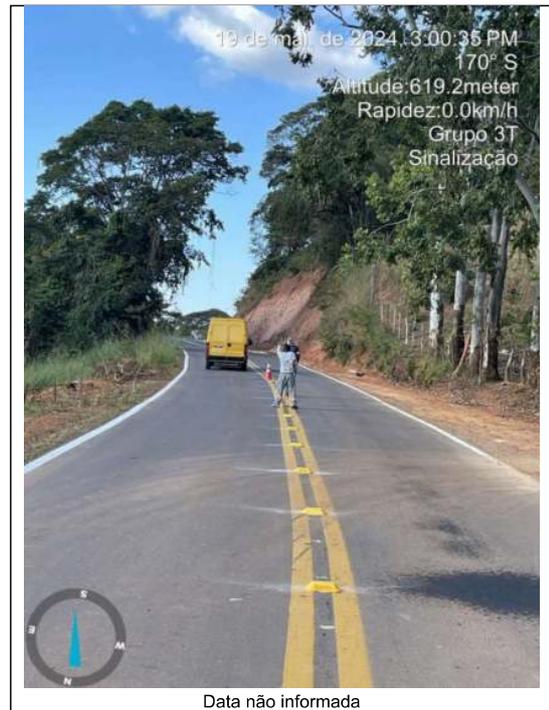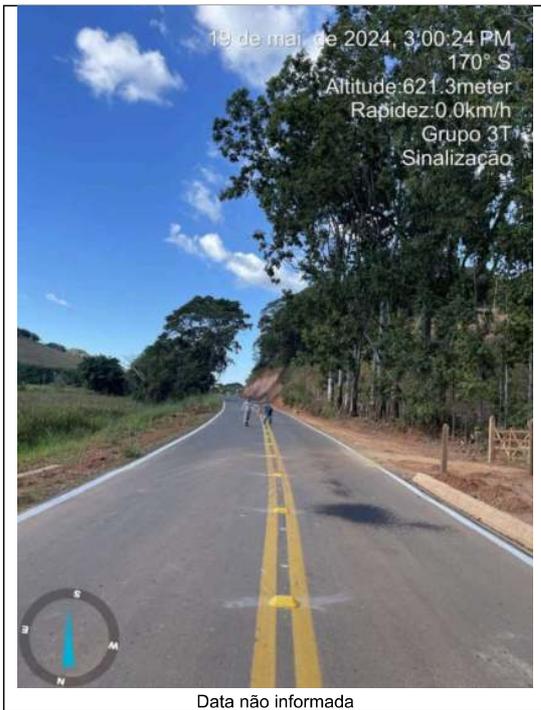

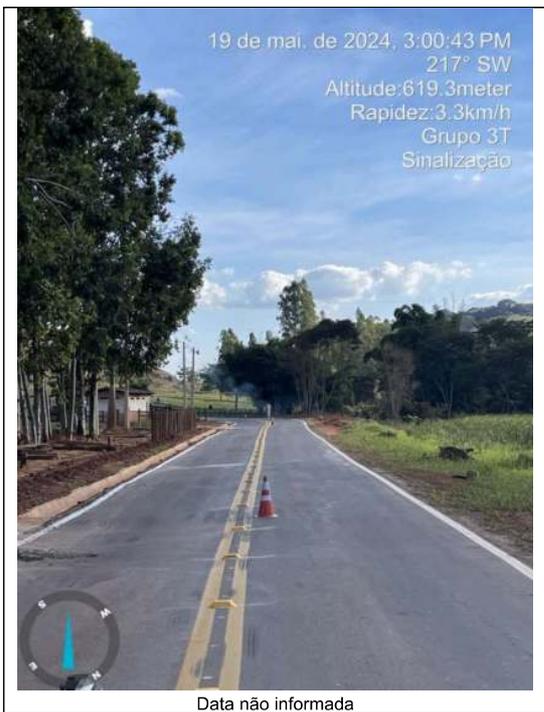



Data não informada


OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES		
EQUIPE E20 19/05/2024		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 22/05/2024 - 08:11)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
_____ JOSÉ MAURICIO PEREIRA DA SILVA Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 16403/D	_____ PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	_____ Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T - SOLOCAP - CONEPP - PAVOTEC CREA 59784/D




Nº 0230	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 21/05/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☁
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MOTORISTA
1	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	AIRLESS (PINTURA DE VIA)		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	SOPRADOR		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	INSTALAÇÃO DE TACHÃO	230 UNIDADES	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)

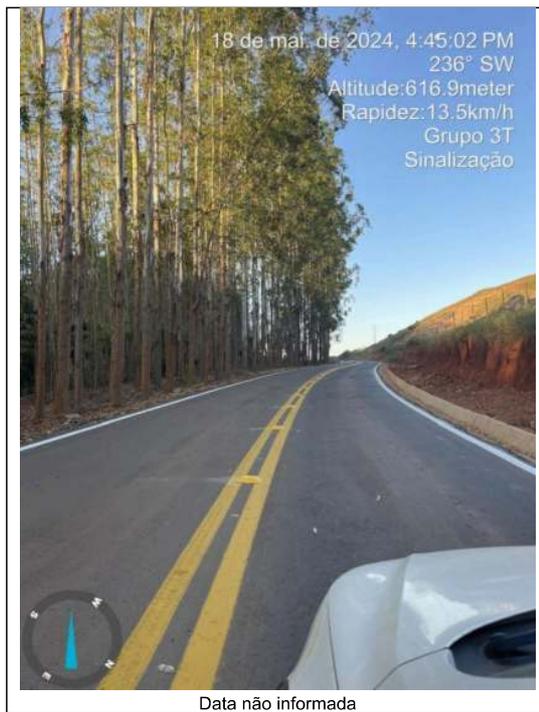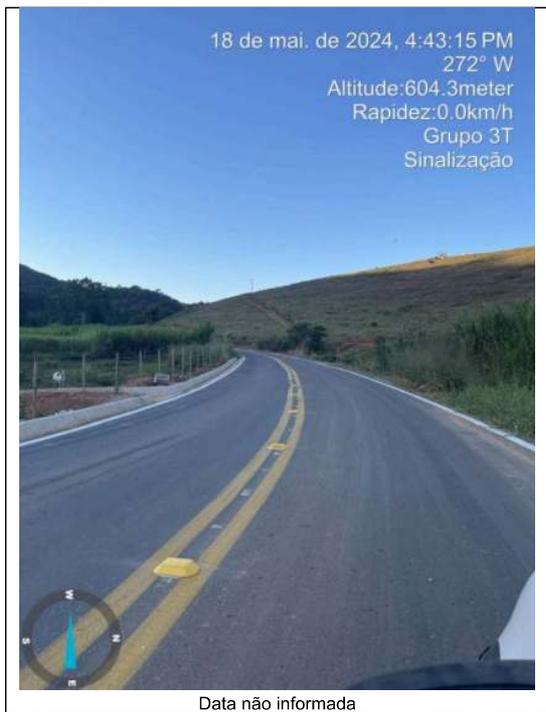

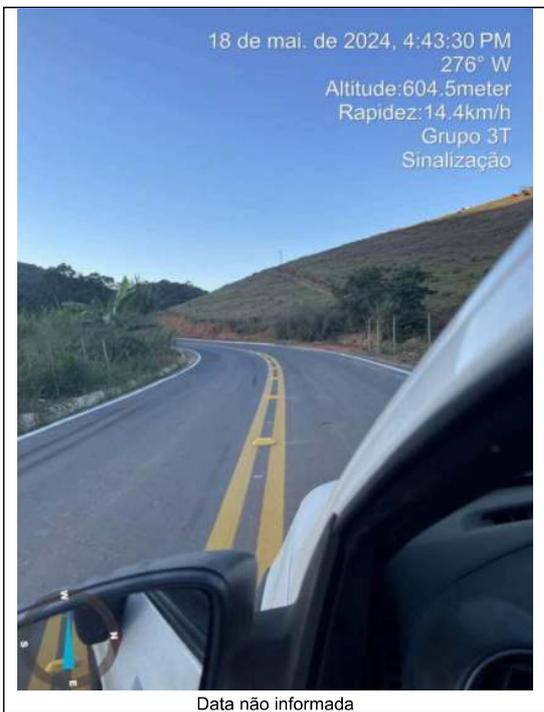

Data não informada

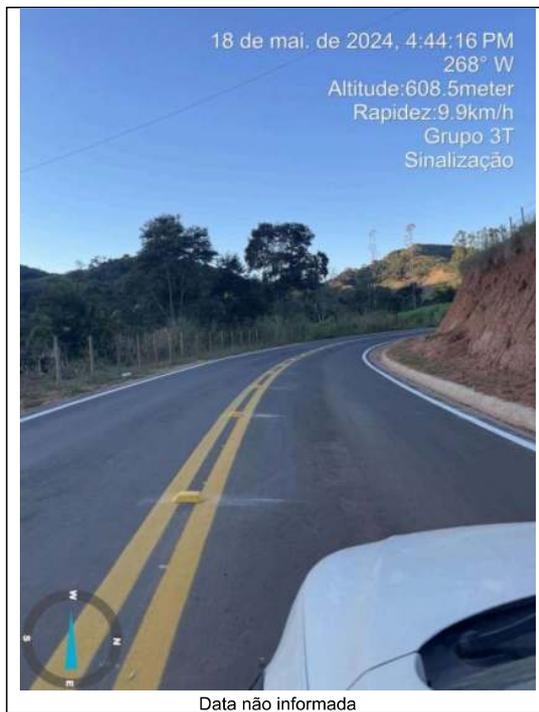

Data não informada


OCORRÊNCIAS	
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA
DESCRÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES	
EQUIPE E20 18/05/2024	
CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Reprovado)
Obs.:	Obs.: FOTOS POSTADAS COM AS DATAS DE REGISTO FORA DO PRAZO
ASSINATURAS	
<p>_____ JOSE MAURICIO PEREIRA DA SILVA Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 16403/D</p>	<p>_____ PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D</p>
<p>_____ Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T – SOLOCAP - CONEPP - PAVOTEC CREA 59784/D</p>	




Nº 0229	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 21/05/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☁
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MOTORISTA
1	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	AIRLESS (PINTURA DE VIA)		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	SOPRADOR		

TAREFAS REALIZADAS		
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES
1	INSTALAÇÃO DE TACHÃO	200 UNIDADES

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)

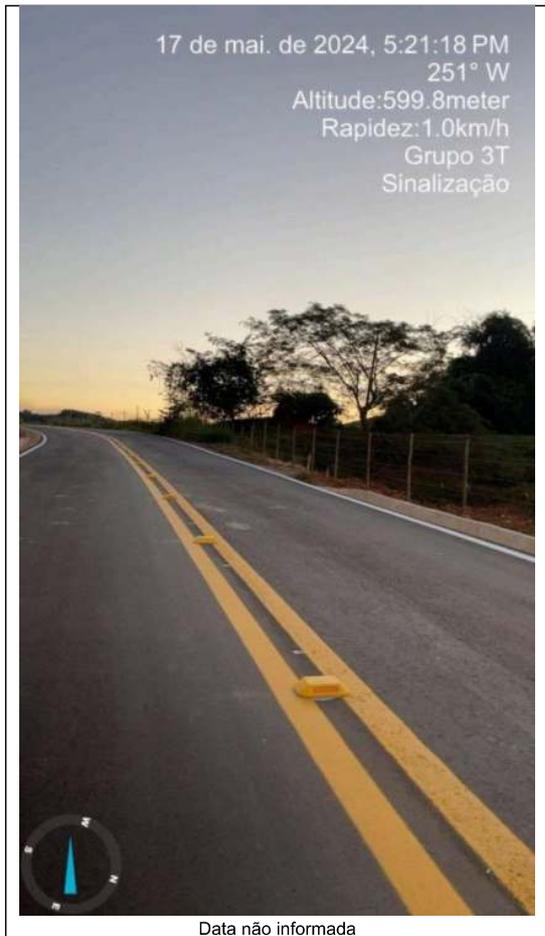

Data não informada

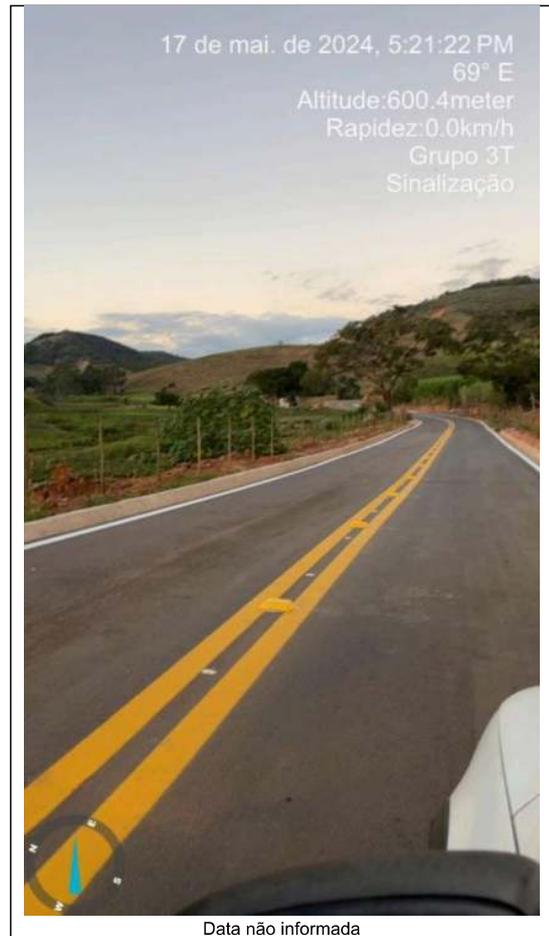

Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES		
EQUIPE E20 17/05/2024		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Reprovado)	
Obs.:	Obs.: FOTOS POSTADAS COM DATA DE REGISTO FORA DO PRAZO	
ASSINATURAS		



JOSE MAURICIO PEREIRA DA SILVA
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 16403/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO
GRAMA
CREA 137.103/D

Luciano Xavier de Castro
RT de Execução - CONSÓRCIO 3T -
SOLOCAP - CONEPP - PAVOTEC
CREA 59784/D





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0228	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D		
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:		
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:		
DATA: 21/05/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☔
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
1	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MOTORISTA	
1	AJUDANTE			
QTDE	EQUIPAMENTO			
1	AIRLESS (PINTURA DE VIA)			
2	VEÍCULO DE APOIO			
1	SOPRADOR			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES		
1	INSTALAÇÃO DE TACHÃO	200 UNIDADES		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)				
OCORRÊNCIAS				
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA		
OBSERVAÇÕES				
EQUIPE E20 16/05/2024				
CONFERÊNCIA				
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Reprovado)			
Obs.:	Obs.: ANEXAR AS FOTOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NAS RDOs			
ASSINATURAS				
JOSE MAURICIO PEREIRA DA SILVA Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 16403/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T - SOLOCAP - CONEPP - PAVOTEC CREA 59784/D





Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **PEDRO MARTINO ZEFERINO**, CPF: 015.49*. **6- *9 em **05/07/2024 10:45:36**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1075.8245.2366.3016.1082**, Com fundamento na Lei N° 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **LUCIANO XAVIER DE CASTRO**, CPF: 760.22* **6- *5 em **05/07/2024 10:39:24**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **10U1.8X39.124W.3703.8385**, Com fundamento na Lei N° 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **JOSE MAURICIO PEREIRA DA SILVA**, CPF: 163.47* **6- *1 em **05/07/2024 08:17:05**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **0882.2817.7056.6426.3065**, Com fundamento na Lei N° 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **78A.C84** - Tipo de Documento: **FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES.**

Elaborado por **GILBERTO ARAUJO GOMIDES**, CPF: 069.58* **6- *7 , em **04/07/2024 - 14:39:14**

Código de Autenticidade deste Documento: 14V2.2Z39.4143.8564.5035

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>

